


Budowa Obwodnicy Rogoźna w ciągu drogi wojewódzkiej nr 241

Informacje dotyczące budowy - stan na
koniec stycznia 2025

DORR

Informacja o kontrakcie

Obwodnica Rogożna- plan orientacyjny

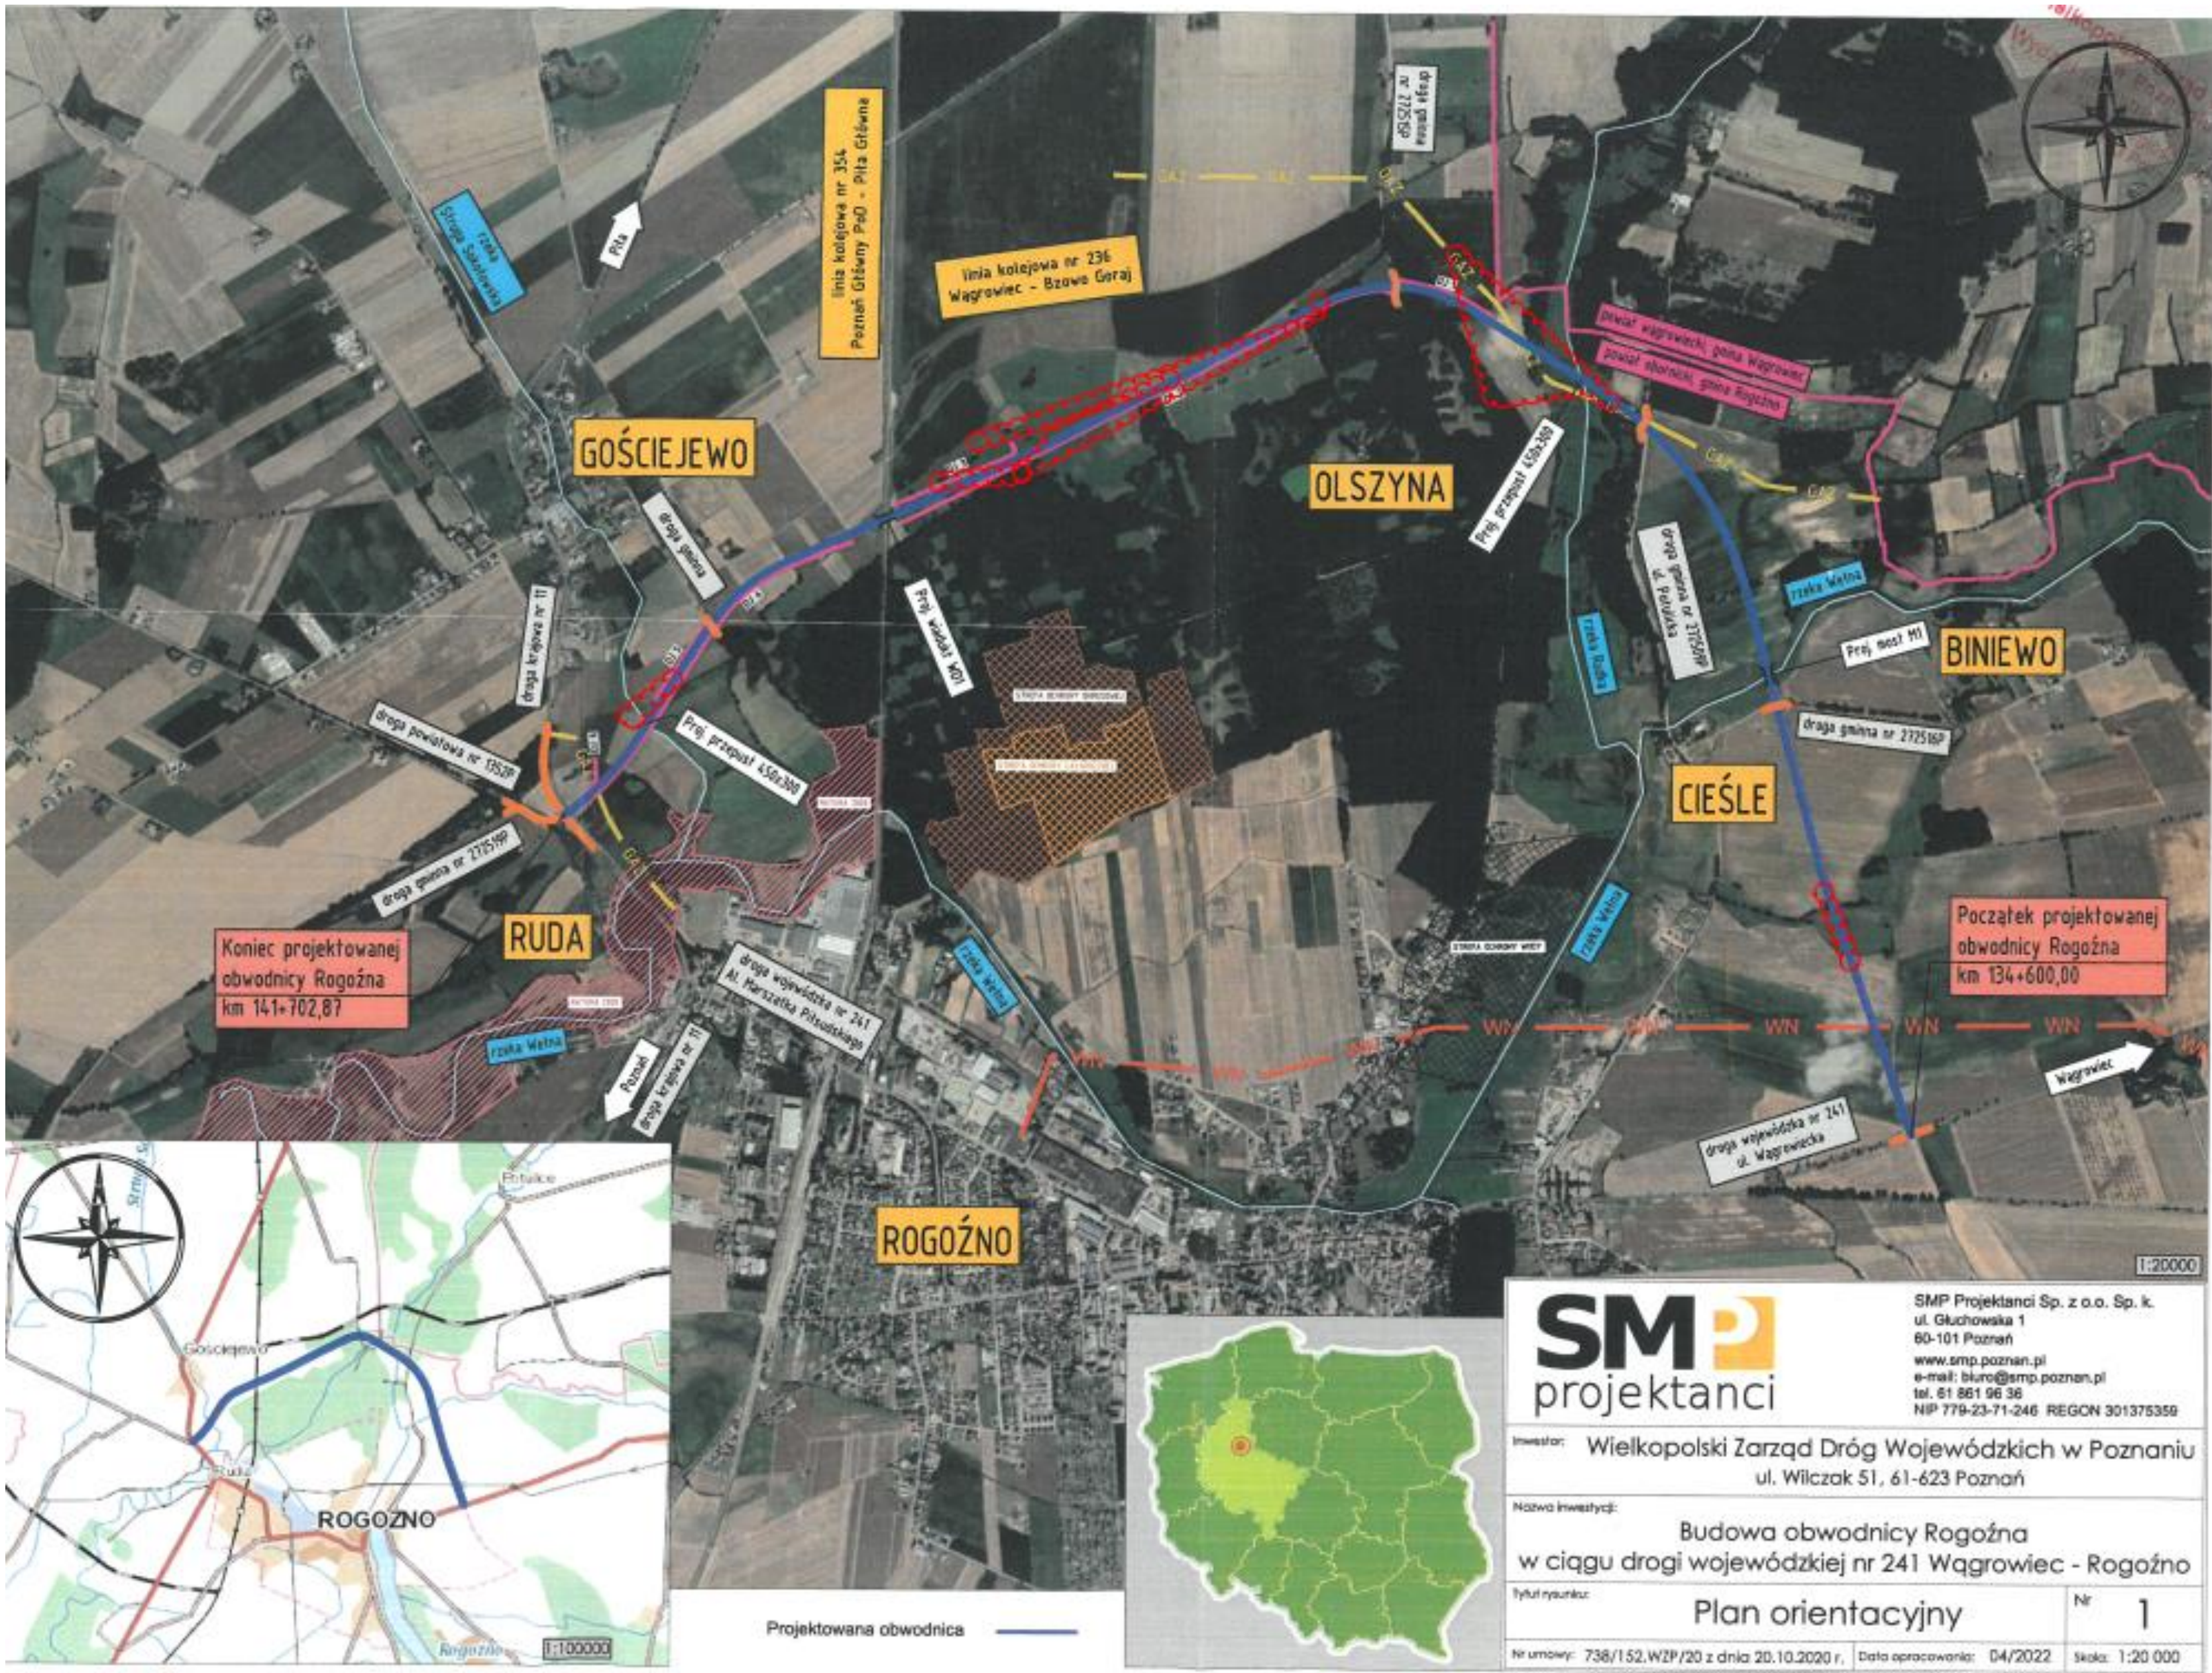

Strony procesu inwestycyjnego

Zamawiający



Wielkopolski Zarząd
Dróg Wojewódzkich
w Poznaniu

Wielkopolski Zarząd Dróg wojewódzkich w Poznaniu
Ul. Wilczak 51; 61-623 Poznań
Kierownik Projektu: Ewelina Stoińska

Inżynier Kontraktu



BBF Sp. z o.o. ul. Dąbrowskiego 461, 60-451 Poznań
Inżynier: Krzysztof Szłaga
Koordynator: Karolina Wróblewska

Wykonawca



PORR S.A.
ul. Hołubcowa 123, 02-854 Warszawa
Biuro Budowy:
ul. Hołubcowa 123, 02-854 Warszawa
Przedstawiciel Wykonawcy: Łukasz Ratajczyk
Kierownik Budowy: Jakub Budziałowski

Projektant



SMP Projektanci
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.
ul. Głuchowska 1
60-101 Poznań



Zakres prac objętych kontraktem


- budowa jezdni o szerokości 7,0 m wraz z poboczymi o szerokości 1,5 m; KR5; dł. 7,103 km;
- Przebudowa i rozbudowa dróg bocznych,
- budowa mostu nad rzeką Wełną: M1 jednoprzęsłowy, belkowo-płytowy, belki żelbetowe T długość 30,6m
- budowa wiaduktu nad linią kolejową WD1 jednoprzęsłowy, belkowo-płytowy, belki stalowe, długość 27,2m
- budowa przepustów skrzynkowych i HDPE400/600/800
- budowa 6 skrzyżowań w tym 2 typu rondo
- budowa oświetlenia, usunięcie kolizji energetycznych i teletechnicznych
- budowa kanalizacji deszczowej, przebudowa urządzeń melioracyjnych
- Przebudowa sieci gazowej W/C i S/C
- przebudowa ścieżki pieszo-rowerowej w ciągu drogi krajowej nr 11
- budowa urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego
- Karczowanie pni drzew i nasadzenia zastępcze
- Wymiany gruntów w 8 lokalizacjach
- wzmocnienie podłoża gruntowego w km 135+252-135+416 i w km 137+400-137+700;



Kadra Wykonawcy bezpośrednio zaangażowana w realizację kontraktu



Schemat organizacyjny Wykonawcy

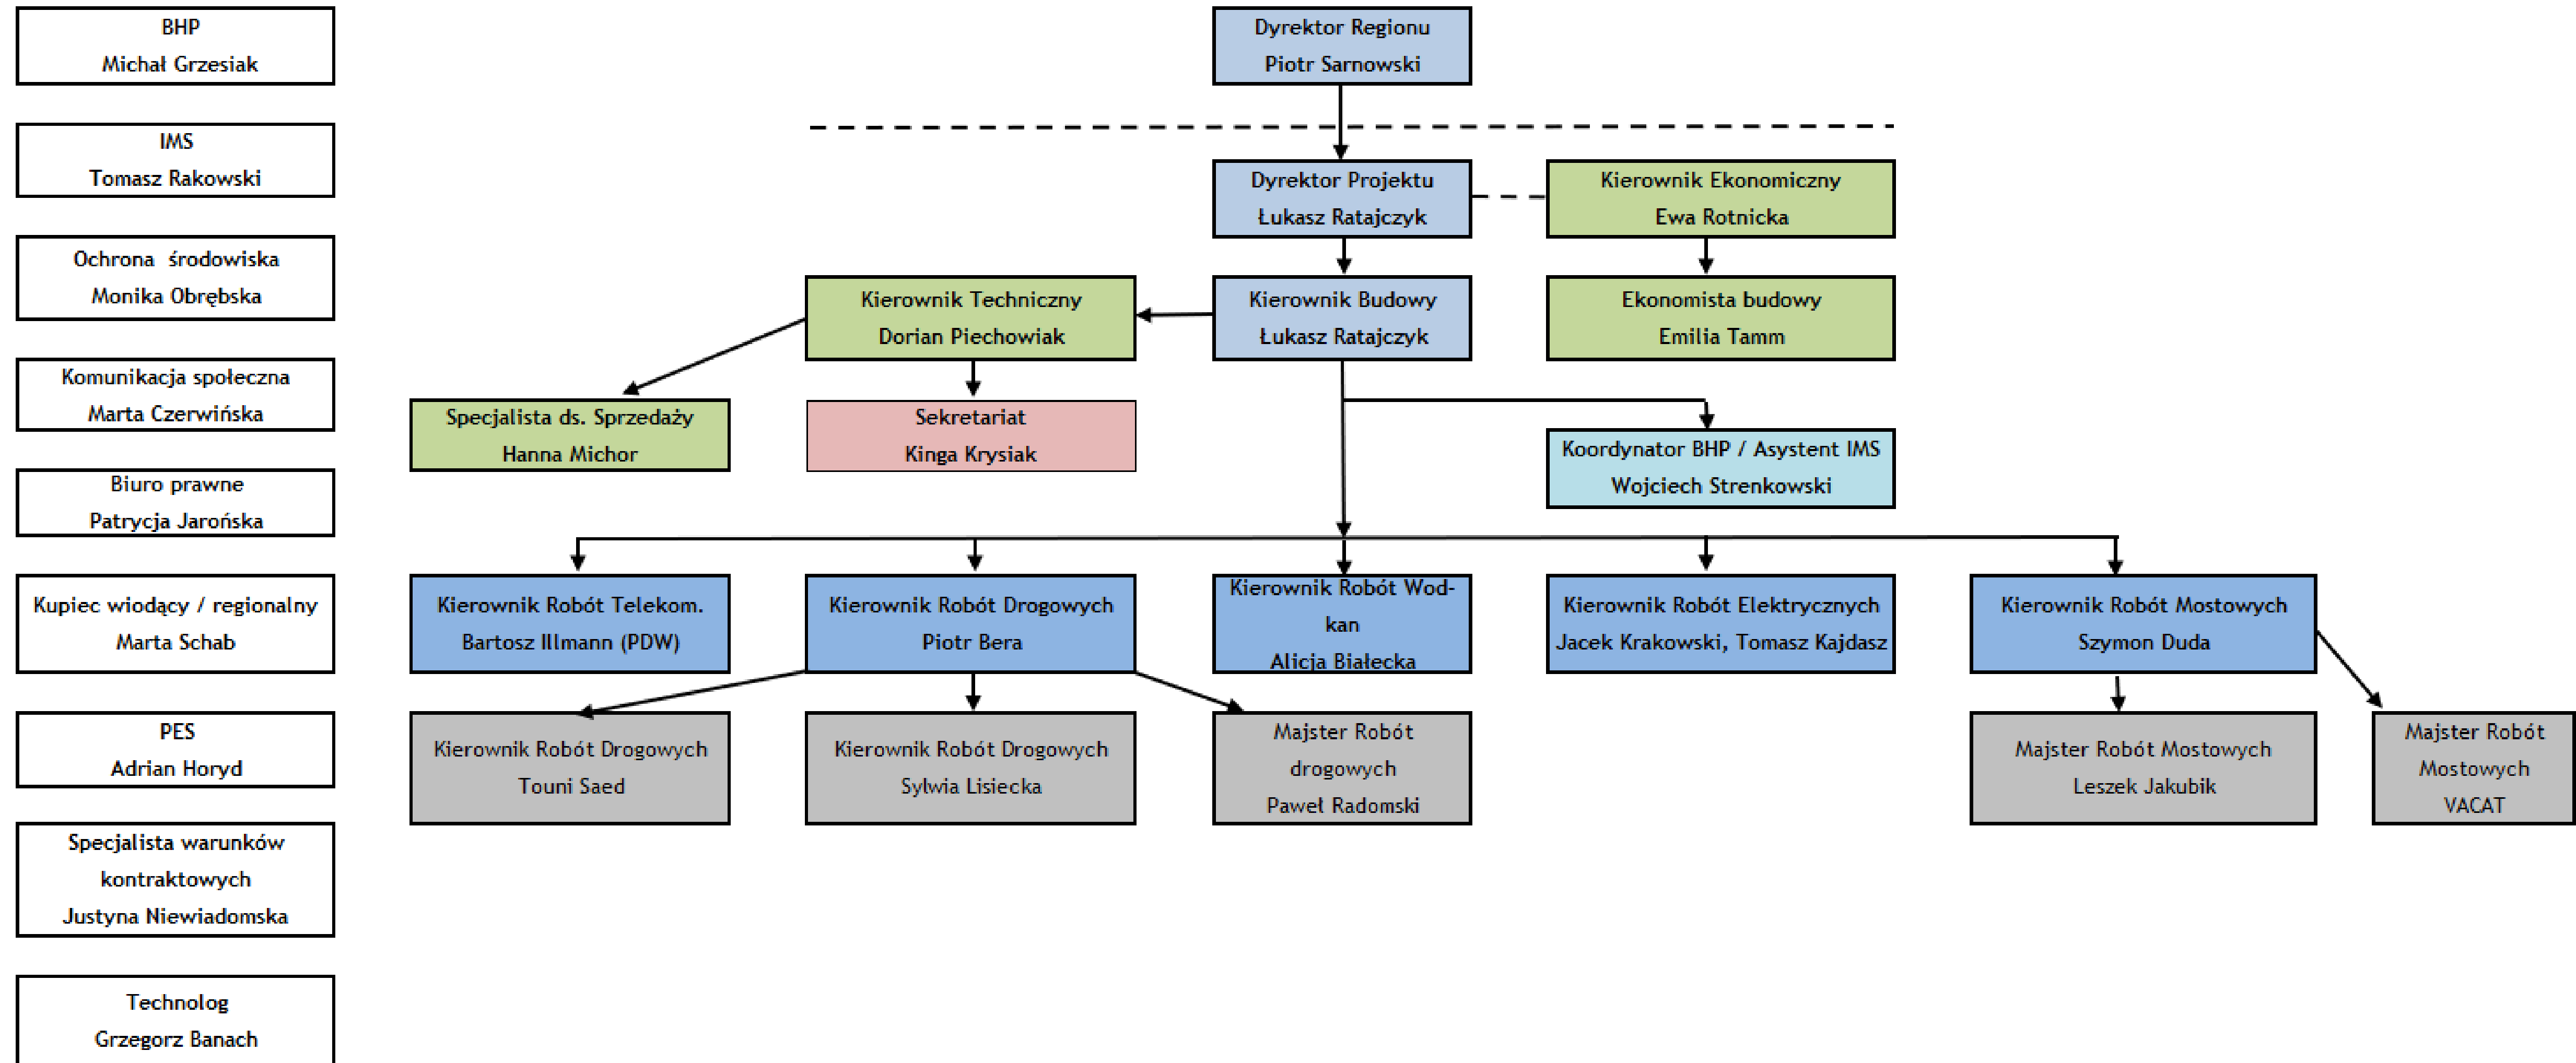

Harmonogram i realizacja

- roboty budowlane

Stan zaawansowania

POSTĘP PRAC NA KONIEC MIESIĄCA 12/2024 r.

Budowa obwodnicy Rogoźna
w ciągu drogi wojewódzkiej nr 241 Wągrowiec - Rogoźno



WYDZIAŁ
FARMACJ
ul. Hołubowa 120, 02-654 Warszawa



ZAKRES	WYKONANIE	0+000	0+050	0+100	0+150	0+200	0+250	0+300	0+350	0+400	0+450	0+500	0+550	0+600	0+650	0+700	0+750	0+800	0+850	0+900	0+950	1+000	1+050	1+100	1+150	1+200	1+250	1+300	1+350	1+400	1+450	1+500	1+550	1+600	1+650	1+700	1+750	1+800	1+850	1+900	1+950	2+000	2+050	2+100	2+150	2+200	2+250	2+300	2+350	2+400	2+450	2+500	2+550	2+600	2+650	2+700	2+750	2+800	2+850	2+900	2+950	3+000	3+050	3+100	3+150	3+200	3+250	3+300	3+350	3+400	3+450	3+500	3+550	3+600	3+650	3+700	3+750	3+800	3+850	3+900	3+950	4+000	4+050	4+100	4+150	4+200	4+250	4+300	4+350	4+400	4+450	4+500	4+550	4+600	4+650	4+700	4+750	4+800	4+850	4+900	4+950	5+000	5+050	5+100	5+150	5+200	5+250	5+300	5+350	5+400	5+450	5+500	5+550	5+600	5+650	5+700	5+750	5+800	5+850	5+900	5+950	6+000	6+050	6+100	6+150	6+200	6+250	6+300	6+350	6+400	6+450	6+500	6+550	6+600	6+650	6+700	6+750	6+800	6+850	6+900	6+950	7+000	7+050	7+100	7+150	7+200	7+250	7+300	7+350	7+400	7+450	7+500	7+550	7+600	7+650	7+700	7+750	7+800	7+850	7+900	7+950	8+000	8+050	8+100	8+150	8+200	8+250	8+300	8+350	8+400	8+450	8+500	8+550	8+600	8+650	8+700	8+750	8+800	8+850	8+900	8+950	9+000	9+050	9+100	9+150	9+200	9+250	9+300	9+350	9+400	9+450	9+500	9+550	9+600	9+650	9+700	9+750	9+800	9+850	9+900	9+950	10+000	10+050	10+100	10+150	10+200	10+250	10+300	10+350	10+400	10+450	10+500	10+550	10+600	10+650	10+700	10+750	10+800	10+850	10+900	10+950	11+000	11+050	11+100	11+150	11+200	11+250	11+300	11+350	11+400	11+450	11+500	11+550	11+600	11+650	11+700	11+750	11+800	11+850	11+900	11+950	12+000	12+050	12+100	12+150	12+200	12+250	12+300	12+350	12+400	12+450	12+500	12+550	12+600	12+650	12+700	12+750	12+800	12+850	12+900	12+950	13+000	13+050	13+100	13+150	13+200	13+250	13+300	13+350	13+400	13+450	13+500	13+550	13+600	13+650	13+700	13+750	13+800	13+850	13+900	13+950	14+000	14+050	14+100	14+150	14+200	14+250	14+300	14+350	14+400	14+450	14+500	14+550	14+600	14+650	14+700	14+750	14+800	14+850	14+900	14+950	15+000	15+050	15+100	15+150	15+200	15+250	15+300	15+350	15+400	15+450	15+500	15+550	15+600	15+650	15+700	15+750	15+800	15+850	15+900	15+950	16+000	16+050	16+100	16+150	16+200	16+250	16+300	16+350	16+400	16+450	16+500	16+550	16+600	16+650	16+700	16+750	16+800	16+850	16+900	16+950	17+000	17+050	17+100	17+150	17+200	17+250	17+300	17+350	17+400	17+450	17+500	17+550	17+600	17+650	17+700	17+750	17+800	17+850	17+900	17+950	18+000	18+050	18+100	18+150	18+200	18+250	18+300	18+350	18+400	18+450	18+500	18+550	18+600	18+650	18+700	18+750	18+800	18+850	18+900	18+950	19+000	19+050	19+100	19+150	19+200	19+250	19+300	19+350	19+400	19+450	19+500	19+550	19+600	19+650	19+700	19+750	19+800	19+850	19+900	19+950	20+000	20+050	20+100	20+150	20+200	20+250	20+300	20+350	20+400	20+450	20+500	20+550	20+600	20+650	20+700	20+750	20+800	20+850	20+900	20+950	21+000	21+050	21+100	21+150	21+200	21+250	21+300	21+350	21+400	21+450	21+500	21+550	21+600	21+650	21+700	21+750	21+800	21+850	21+900	21+950	22+000	22+050	22+100	22+150	22+200	22+250	22+300	22+350	22+400	22+450	22+500	22+550	22+600	22+650	22+700	22+750	22+800	22+850	22+900	22+950	23+000	23+050	23+100	23+150	23+200	23+250	23+300	23+350	23+400	23+450	23+500	23+550	23+600	23+650	23+700	23+750	23+800	23+850	23+900	23+950	24+000	24+050	24+100	24+150	24+200	24+250	24+300	24+350	24+400	24+450	24+500	24+550	24+600	24+650	24+700	24+750	24+800	24+850	24+900	24+950	25+000	25+050	25+100	25+150	25+200	25+250	25+300	25+350	25+400	25+450	25+500	25+550	25+600	25+650	25+700	25+750	25+800	25+850	25+900	25+950	26+000	26+050	26+100	26+150	26+200	26+250	26+300	26+350	26+400	26+450	26+500	26+550	26+600	26+650	26+700	26+750	26+800	26+850	26+900	26+950	27+000	27+050	27+100	27+150	27+200	27+250	27+300	27+350	27+400	27+450	27+500	27+550	27+600	27+650	27+700	27+750	27+800	27+850	27+900	27+950	28+000	28+050	28+100	28+150	28+200	28+250	28+300	28+350	28+400	28+450	28+500	28+550	28+600	28+650	28+700	28+750	28+800	28+850	28+900	28+950	29+000	29+050	29+100	29+150	29+200	29+250	29+300	29+350	29+400	29+450	29+500	29+550	29+600	29+650	29+700	29+750	29+800	29+850	29+900	29+950	30+000	30+050	30+100	30+150	30+200	30+250	30+300	30+350	30+400	30+450	30+500	30+550	30+600	30+650	30+700	30+750	30+800	30+850	30+900	30+950	31+000	31+050	31+100	31+150	31+200	31+250	31+300	31+350	31+400	31+450	31+500	31+550	31+600	31+650	31+700	31+750	31+800	31+850	31+900	31+950	32+000	32+050	32+100	32+150	32+200	32+250	32+300	32+350	32+400	32+450	32+500	32+550	32+600	32+650	32+700	32+750	32+800	32+850	32+900	32+950	33+000	33+050	33+100	33+150	33+200	33+250	33+300	33+350	33+400	33+450	33+500	33+550	33+600	33+650	33+700	33+750	33+800	33+850	33+900	33+950	34+000	34+050	34+100	34+150	34+200	34+250	34+300	34+350	34+400	34+450	34+500	34+550	34+600	34+650	34+700	34+750	34+800	34+850	34+900	34+950	35+000	35+050	35+100	35+150	35+200	35+250	35+300	35+350	35+400	35+450	35+500	35+550	35+600	35+650	35+700	35+750	35+800	35+850	35+900	35+950	36+000	36+050	36+100	36+150	36+200	36+250	36+300	36+350	36+400	36+450	36+500	36+550	36+600	36+650	36+700	36+750	36+800	36+850	36+900	36+950	37+000	37+050	37+100	37+150	37+200	37+250	37+300	37+350	37+400	37+450	37+500	37+550	37+600	37+650	37+700	37+750	37+800	37+850	37+900	37+950	38+000	38+050	38+100	38+150	38+200	38+250	38+300	38+350	38+400	38+450	38+500	38+550	38+600	38+650	38+700	38+750	38+800	38+850	38+900	38+950	39+000	39+050	39+100	39+150	39+200	39+250	39+300	39+350	39+400	39+450	39+500	39+550	39+600	39+650	39+700	39+750	39+800	39+850	39+900	39+950	40+000	40+050	40+100	40+150	40+200	40+250	40+300	40+350	40+400	40+450	40+500	40+550	40+600	40+650	40+700	40+750	40+800	40+850	40+900	40+950	41+000	41+050	41+100	41+150	41+200	41+250	41+300	41+350	41+400	41+450	41+500	41+550	41+600	41+650	41+700	41+750	41+800	41+850	41+900	41+950	42+000	42+050	42+100	42+150	42+200	42+250	42+300	42+350	42+400	42+450	42+500	42+550	42+600	42+650	42+700	42+750	42+800	42+850	42+900	42+950	43+000	43+050	43+100	43+150	43+200	43+250	43+300	43+350	43+400	43+450	43+500	43+550	43+600	43+650	43+700	43+750	43+800	43+850	43+900	43+950	44+000	44+050	44+100	44+150	44+200	44+250	44+300	44+350	44+400	44+450	44+500	44+550	44+600	44+650	44+700	44+750	44+800	44+850	44+900	44+950	45+000	45+050	45+100	45+150	45+200	45+250	45+300	45+350	45+400	45+450	45+500	45+550	45+600	45+650	45+700	45+750	45+800	45+850	45+900	45+950	46+000	46+050	46+100	46+150	46+200	46+250	46+300	46+350	46+400	46+450	46+500	46+550	46+600	46+650	46+700	46+750	46+800	46+850	46+900	46+950	47+000	47+050	47+100	47+150	47+200	47+250	47+300	47+350	47+400	47+450	47+500	47+550	47+600	47+650	47+700	47+750	47+800	47+850	47+900	47+950	48+000	48+050	48+100	48+150	48+200	48+250	48+300	48+350	48+400	48+450	48+500	48+550	48+600	48+650	48+700	48+750	48+800	48+850	48+900	48+950	49+000	49+050	49+100	49+150	49+200	49+250	49+300	49+350	49+400	49+450	49+500	49+550	49+600	49+650	49+700	49+750	49+800	49+850	49+900	49+950	50+000	50+050	50+100	50+150	50+200	50+250	50+300	50+350	50+400	50+450	50+500	50+550	50+600	50+650	50+700	50+750	50+800	50+850	50+900	50+950	51+000	51+050	51+100	51+150	51+200	51+250	51+300	51+350	51+400	51+450	51+500	51+550	51+600	51+650	51+700	51+750	51+800	51+850	51+900	51+950	52+000	52+050	52+100	52+150	52+200	52+250	52+300	52+350	52+400	52+450	52+500	52+550	52+600	52+650	52+700	52+750	52+800	52+850	52+900	52+950	53+000	53+050	53+100	53+150	53+200	53+250	53+300	53+350	53+400	53+450	53+500	53+550	53+600	53+650	53+700	53+750	53+800	53+850	53+900	53+950	54+000	54+050	54+100	54+150	54+200	54+250	54+300	54+350	54+400	54+450	54+500	54+550	54+600	54+650	54+700	54+750	54+800	54+850	54+900	54+950	55+000	55+050	55+100	55+150	55+200	55+250	55+300	55+350	55+400	55+450	55+500	55+550	55+600	55+650	55+700	55+750	55+800	55+850	55+900	55+950	56+000	56+050	56+100	56+150	56+200	56+250	56+300	56+350	56+400	56+450	56+500	56+550	56+600	56+650	56+700	56+750	56+800	56+850	56+900	56+950	57+000	57+050
--------	-----------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

LEGENDA

WYKONANE

W TYM MIESIĄCU

PLANOWANE

ZAKRES	WYKONANIE
ROBOTY DROGOWE	
DW241	
ODHUMUSOWANIE	62,32%
WYKOPY	0,00%
NASYPY	18,59%
PODBUDOWA POMOCNICZA Z MIESZANKI NIEZWIĄZANEJ	0,00%
PODBUDOWA BITUMICZNA	0,00%
WARSTWA WIAŻĄCA	0,00%
WARSTWA ŚCIERALNA	0,00%
ROBOTY WYKOŃCZENIOWE (humusowanie/pobocza)	0,00%
RONDA	
ROBOTY ZIEMNE	0,00%
NAWIERZCHNI	0,00%
ROBOTY BRUKARSKIE	0,00%
ROBOTY MOSTOWE	
ROBOTY ZIEMNE	20,09%
PRZYZCÓŁKI	16,39%
USTRÓJ NOŚNY	0,00%
PŁYTA USTROJU NOŚNEGO	0,00%
IZOLACJE I NAWIERZCHNIE	0,00%
ODWODNIENIE I DYLATACJE	0,00%
ELEMENTY ZABEZPIECZAJĄCE	0,00%
PRACE WYKOŃCZENIOWE	0,00%
ROBOTY BRANŻOWE	
PRZEPUSTY I ZARUROWANIA	3,42%
KANALIZACJA DESZCZOWA	0,43%
SIEĆ WODOCIĄGOWA	74,30%
SIEĆ GAZOWA WYSOKIEGO CIŚNIENIA	0,00%
SIEĆ GAZOWA ŚREDNIEGO CIŚNIENIA	5,05%
OŚWIETLENIE DROGOWE	0,00%
BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA	40,00%
BRANŻA TELEKOMUNIKACYJNA	23,77%
WZMOCNIENIE PODŁOŻA	0,00%

[illegible]


Stan zaawansowania

Działanie / Grupa robót / Odcinek	planowane (wg Harmonogramu)	wykonane (faktycznie)	Różnica pomiędzy robotami planowanymi a wykonanymi
	[%]	[%]	[%]
Roboty Drogowe	14,42%	16,50%	2,08%
Roboty mostowe	6,23%	8,35%	2,12%
Roboty inst. WOD-KAN, GAZ	0,00%	11,00%	11,00%
Roboty elektryczne	17,03%	27,02%	9,99%
Roboty telekomunikacyjne	28,08%	35,00%	6,92%
Ogółem	10,65%	12,50%	1,85%



Zaawansowanie kontraktu finansowo-rzeczowe w porównaniu do Harmonogramu (brutto)

■ Wartość wykonanych robót ■ Wartość sprzedaży ■ Wartość wg Harmonogramu pierwotnego

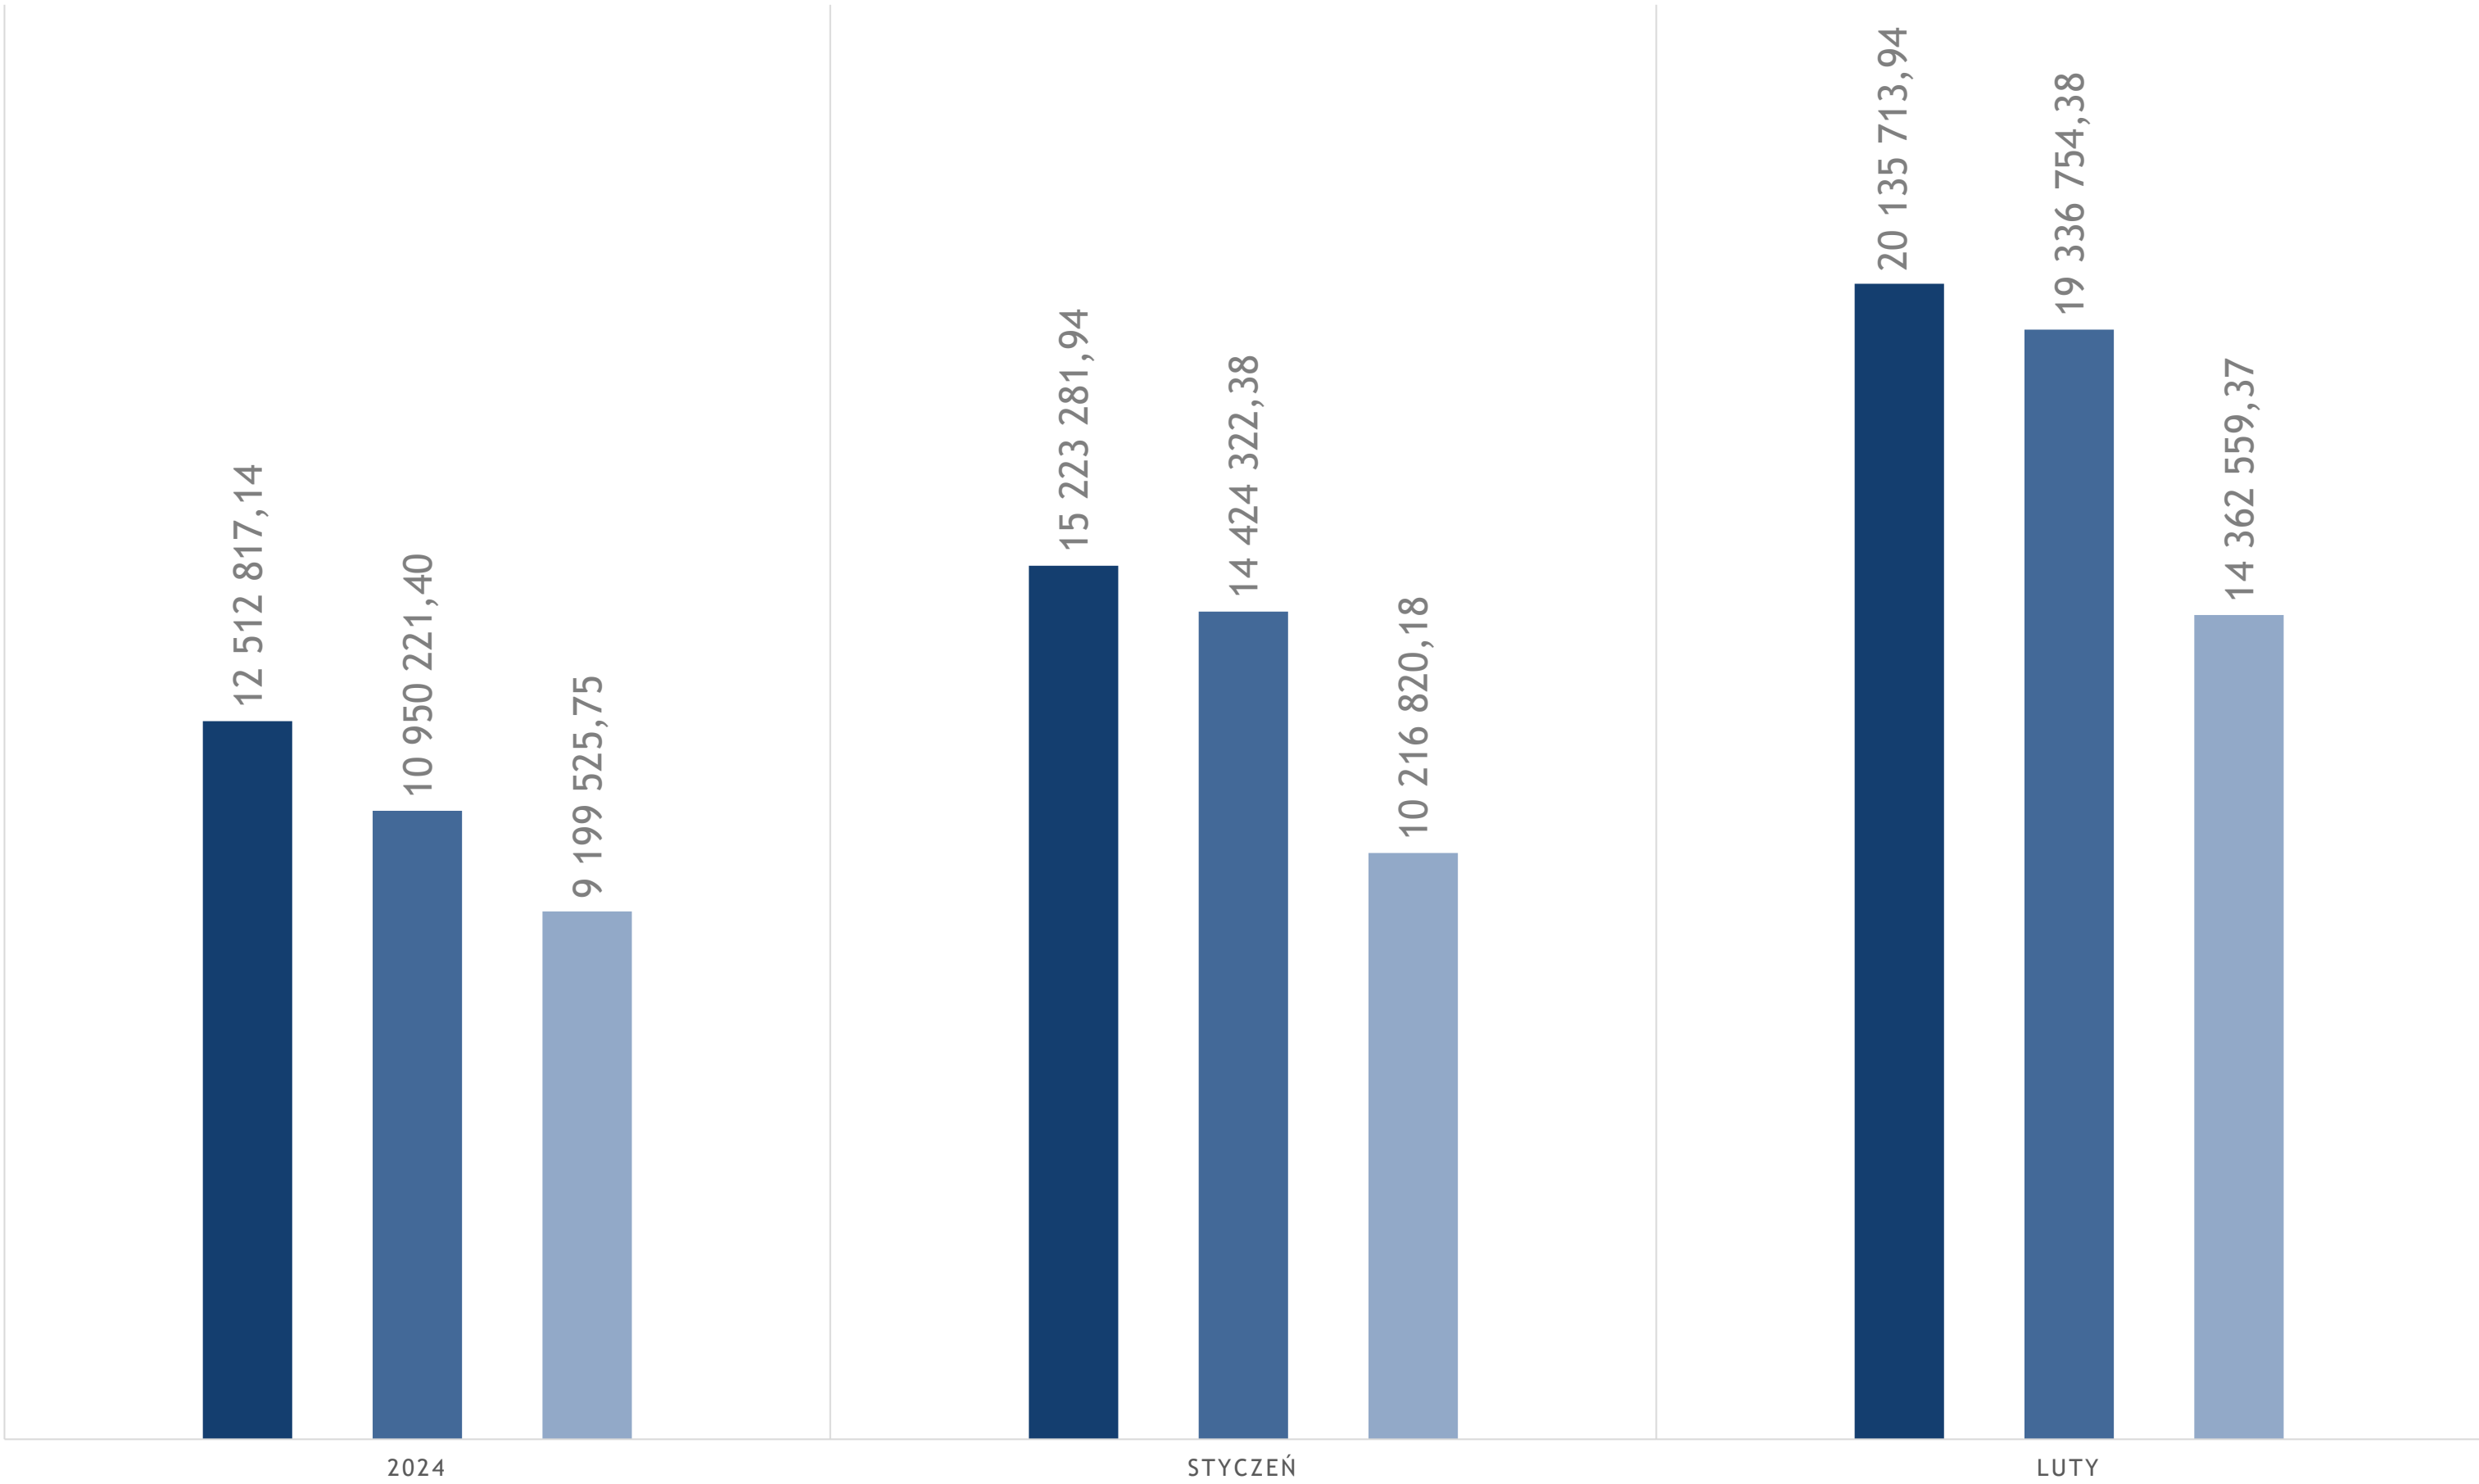

Prace wykonane - stan na koniec stycznia 2025

Lp.	Odcinek	Opis wykonywanych prac
1	Pomiędzy DW a mostem na Wełnie	Kontynuacja wykonania odhumusowania i nasypów
2	Pomiędzy mostem na Wełnie a Rudką	Kontynuacja wykonania nasypów
3	W obrębie Rudki	Wykonanie wymiany
4	Pomiędzy Rudką na wiaduktem WD-1	Kontynuacja wykonania wymiany
5	Na dojeździe do wiaduktu WD-1	Wykonanie nasypów
6	DJ1	Odhumusowanie i nasyp
7	Most M-1	Wykonanie wykopu i korka pod posadowienie podpór oraz betonu podkładowego Zbrojenie ław fundamentowych oraz korpusów P1 i P2 Betonowanie ław fundamentowych P1 i P2 Zbrojenie korpusów podpór P1 i P2
8	Wiadukt WD-1	Betonowanie ław fundamentowych P1 Zbrojenie korpusów P1 i P2
9	Przepust P-3	Wykonanie wykopu, korka betonowego pod posadowienie oraz betonu podkładowego pod ławy wlotu i wylotu
	Przepust P-6A/B/C	Wbicie grodzic tymczasowych
10	Całość prac	Wykonanie wpięć wodociągów do istniejącej sieci
11	Przy DW i drodze na Biniewo	Sieć gazowa średniego ciśnienia - montaż rur
12	Pomiędzy DW a mostem na Wełnie oraz wiaduktem WD-1 a DK	Montaż rur drenarskich



Środki wykonawcy:

- personel
- sprzęt
- podwykonawcy

Środki Wykonawcy

Personel budowy w miesiącu styczniu :

- pracownicy umysłowi - nadzór budowy, usługi - 18 osób
- pracownicy fizyczni budowy/operatorzy sprzętu na budowie - 70 osób

Sprzęt w miesiącu styczniu :

- 6 koparki
- 2 spycharki
- 1 walec
- 1 równiarka
- 1 ładowarka
- 1 beczka z wodą
- 1 żuraw samojezdny
- 1 żuraw samochodowy z wibromłotem
- 1 podnośnik koszowy
- 1 ładowarka teleskopowa
- 7 pompa do betonu
- 84 betonowozy
- 2 koparko ładowarka
- 1 minikoparki
- 40 pojazdów transportowych

Plan robót na kolejny miesiąc

DORR

Plan robót na miesiąc luty 2025

Lp.	Odcinek	Opis wykonywanych prac
1	Pomiędzy DW a mostem na Wełnie	Wykonanie wymiany
2	Pomiędzy DW a mostem na Wełnie	Kontynuacja wykonania nasypów
3	W obrębie Rudki	Wykonanie wymiany
4	Pomiędzy Rudką na wiaduktem WD-1	Rozpoczęcie przygotowania podłoża
5	Na dojeździe do wiaduktu WD-1	Wykonanie odhumusowania, wymiany oraz nasypu - kontynuacja
6	Most M-1	Zbrojenie korpusów skrzydeł podpory P1 i P2
7	Wiadukt WD-1	Betonowanie korpusu podpory P1 i P2
8	Przepust P-3a	Zbrojenie ław wlotu i wylotu Betonowanie ław wlotu i wylotu Wykonanie materaca pod posadowienie oraz montaż prefabrykatów skrzynkowych
9	Przepust P-6 b	Wykonanie korka C12/15 pod posadowienie Wykonanie wlotu i wylotu (zbrojenie + betonowanie) Wykonanie materaca pod posadowienie oraz montaż prefabrykatów skrzynkowych
10	Pomiędzy DW a mostem na Wełnie oraz wiaduktem WD-1 a DK	Montaż rur drenarskich - kontynuacja
11	Przy DW i drodze na Biniewo	Przebudowa sieci gazowej S.C. - kontynuacja
12	Całość prac	Przebudowa kolizji sieci teletechnicznych - kontynuacja
13	Całość prac	Przebudowa kolizji sieci elektroenergetycznych - kontynuacja



Jakość robót

Jakość Robót

Obsługa laboratoryjna budowy została zlecona zewnętrznemu akredytowanemu laboratorium.

Nadzór technologiczny ze strony Wykonawcy pełni Technolog Regionu wspomagając się Laboratorium Centralnym PORR S.A.

Wykonywane badania laboratoryjne w asortymencie i ilościach zgodnych z SST potwierdzają prawidłową jakość wykonanych dotychczas robót.

Bezpieczeństwo pracy i ochrona środowiska



Bezpieczeństwo pracy i ochrona środowiska

- Na kontrakcie wyznaczono osobę pełniącą funkcję koordynatora BHP i ochrony środowiska.
- Obsługę środowiskową kontraktu zlecono zewnętrznej firmie usługodawczej
- Wszyscy pracownicy przed rozpoczęciem pracy na budowie są przeszkoleni i zapoznani z planem BIOZ.
- Na wszystkie prowadzone na budowie prace opracowywane są Instrukcje Bezpiecznego Wykonania Robót, a pracownicy prowadzący te prace zapoznani są z ich treścią.
- Wykonawca codziennie przeprowadza kontrole BHPiOŚ na terenie placu budowy. Na podstawie wykonywanych kontroli sporządzany jest wewnętrzny cotygodniowy raport BHPiOŚ.

Dokumentacja fotograficzna

DORR

Odhumusowanie 136+420 - 136+100



Budowa nasypu 136+200 - 136+600



Budowa nasypu oraz wykonanie rowów 137+900 - 139+200



Wykonanie wymiany 140+000 - 140+100



Budowa nasypów zbrojonych 140+000 - 140+100



Most M-1 - Zbrojenie korpusów podpory P1 i P2



Wiadukt WD-1 - Zbrojenie ławy fundamentowej - grudzień 2024



Wiadukt WD-1 - Betonowanie ław fundamentowych - grudzień 2024



WD-1 Zbrojenie oraz wykonanie szalunku podpory P2



Przepust P6 - Wykonanie korka betonowego oraz betonu podkładowego



Wbicie grodzic stalowych- Przepust P3 - grudzień 2024



Zdjęcia z nalogu - luty 2025



Zdjęcia z nalogu - luty 2025



Zdjęcia z nalotu - luty 2025



Zdjęcia z nalotu - luty 2025



Zdjęcia z nalotu - luty 2025



DORR

Zdjęcia z nalotu - luty 2025



DORR

Zdjęcia z nalotu - luty 2025



Zdjęcia z nalogu - luty 2025



DORR

powered by **DORR**
